АКТ № 8/1

о выполнении работ по объекту концессионного соглашения.

(о произведенных работах по концессионному соглашению от 26 декабря 2016 года в отношении объектов недвижимости муниципального образования городского округа город Урай в период с 01 сентября 2018 года по 30 ноября 2018 года)

город Урай **30 ноября 2018 года**

Администрация города Урай, в лице начальника муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» Лаушкина Олега Александровича, действующего на основании постановления администрации города Урай от 31.10.2016 № 3343, именуемый в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и акционерного общества «Урайтеплоэнергия», в лице генерального директора Жевлакова Виктора Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1.Во исполнение пункта 1.1 Концессионного соглашения от 26 декабря 2016 года в период с 01 сентября 2018 года по 30 ноября 2018 года «Концессионер» выполнил работы по обязательству вышеназванного соглашения (далее Работы).

2.Сведения о выполненных Работах: Согласно локально-сметного расчета на объект «Реконструкция сетей ГВС от МАК-4 с применением трубы Изопрофлекс-А» (участок от ж.д. 3-41 до ж.д. 3-47) выполнены следующие виды работ:

Наименование	Ед. изм.	Кол.
Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2	1000 м3	0,8
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,45
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3	0,45
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов	1000 м3	0,8
Прим. Демонтаж плит перекрытий площадью: до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	100 шт	0,02
Очистка камер: от мокрого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем	м3	0
Укладка плит перекрытий площадью: до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	100 шт	0,02
Устройство камер со стенками: из бетонных блоков	100 м3	0,04
Прим. Демонтаж дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: свыше 10,5 м2	100 м3	0,1
Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: свыше 10,5 м2	100 м3	0,1
Прим.Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим	км	0

испытанием диаметром: 200 мм (гильзы)		
Укладка полиэтиленовых труб газопроводов в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода до 63 мм	100 м	4,22
Укладка полиэтиленовых труб газопроводов в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода свыше 63 до 110 мм	100 м	7,58
Укладка полиэтиленовых труб газопроводов в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода свыше 110 до 160 мм	100 м	4,36
Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм	т	0,5
Фасонные стальные сварные части, диаметр: до 800 мм	т	0
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	3,3428
Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	3,3428
Подвешивание коробов подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,25 м2	м	10
Демонтаж бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1
Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1
Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм	100 м2	1
Устройство мостовых мозаиковых с заполнением швов цементным раствором при высоте мозаиковой шашки: 10 см	1000 м2	0,1
Пробивка проемов в конструкциях: из бетона	м3	1
Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	м3	1
Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 150 мм	100 м	0,5
Устройство швов в бетоне: затвердевшем	100 м	0,8
Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3	0,04
Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона	100 т	0,09
Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см	100 м2	0,2

Примечание: В соответствии с постановлением Правительства ХМАО-Югры от 11.07.2014 № 257-п разрешение на строительство и (или) реконструкцию тепловых сетей, предназначенных для транспортировки водяного пара или горячей воды с внутренним диаметром до 300 миллиметров включительно – не требуется.

3. Указанные Работы выполнены полностью, что подтверждается документами согласно приложению. «Концедент» по объему, качеству результата выполнения Работ претензий не имеет.

4. Указанные работы включены в приложение 8 Соглашения на 2019 г., 2020 г. и выполнены в связи с неудовлетворительным техническим состоянием сетей ГВС и с большим количеством технологических отказов на данном участке.

Приложение

1. Копия Локально-сметного расчета на объект: «Реконструкция сетей ГВС от МАК-4 с применением трубы Изопрофлекс-А» (участок от ж.д. 3-41 до ж.д. 3-47) на 8 л.
2. Фотоматериалы на 4 л.
3. Исполнительная документация 3 л.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

Генеральный директор АО «Урайтеплоэнергия»_____В.А.Жевлаков

Начальник МКУ «УЖКХ г.Урай»_____О.А.Лаушкин

Исполнители:

Начальник ПТО АО «Урайтеплоэнергия»_____Т.В.Жевлаков

Ведущий инженер ПТО МКУ «УЖКХ г.Урай»_____С.В.Нурмухаметова

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
АО "Урайтеплоэнергия"
_____А.В. Сазонов
"_____" _____ 201_ год

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Реконструкция сетей ГВС от МАК-4 с применением трубы Изопрофлекс-А (участок от ж.д. 3-41 до ж.д. 3-47)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____7952012,59 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв 2018 г.

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору-дования, т
					Всего	В том числе			Обору-дование	Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Земляные работы																
1	**ФЕР01-01-004-05** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): фер ОЗП=27,36; ЭМ=11,93; ЗПМ=27,36; МАТ=3,69*	1000 м3	0,8	4214,1	100,31	4113,79	681,62		3371,28	80,25	3291,03	545,3	12,86	10,29	
2	**ФЕР01-02-057-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): фер ОЗП=27,36; ЭМ=11,93; ЗПМ=27,36; МАТ=3,69*	100 м3	0,45	1201,2	1201,2				540,54	540,54			154	69,3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	**ФЕР01-02-061-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *фер ОЗП=27,36; ЭМ=11,93; ЗПМ=27,36; МАТ=3,69*	100 м3	0,45	729	729				328,05	328,05			97,2	43,74	
4	**ФЕР01-01-033-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *фер ОЗП=27,36; ЭМ=11,93; ЗПМ=27,36; МАТ=3,69*	1000 м3	0,8	527,5		527,5	102,89		422		422	82,31			
Раздел 2. ГВС																
5	**ФЕР07-01-006-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Прим. Демонтаж плит перекрытий площадью: до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т *(Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *фер ОЗП=27,36; ЭМ=11,93; ЗПМ=27,36; МАТ=3,69*	100 шт	0,02	4106,18	1232,29	2873,89	346,52		82,12	24,65	57,47	6,93	135,864	2,72	
7	**ФЕР07-01-006-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Укладка плит перекрытий площадью: до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *фер ОЗП=27,36; ЭМ=11,93; ЗПМ=27,36; МАТ=3,69*	100 шт	0,02	8095,86	1540,36	3592,36	433,15		161,92	30,81	71,85	8,66	169,83	3,4	
8	**ФЕР07-06-002-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство камер со стенками: из бетонных блоков *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *фер ОЗП=27,36; ЭМ=11,93; ЗПМ=27,36; МАТ=3,69*	100 м3	0,04	20412,2	8502,88	9221,18	1083,66		816,49	340,12	368,85	43,35	926,24	37,05	
9	**ФЕР27-06-001-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Прим. Демонтаж дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: свыше 10,5 м2 *(Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *фер ОЗП=27,36; ЭМ=11,93; ЗПМ=27,36; МАТ=3,69*	100 м3	0,1	7060,62	1010,83	6049,79	627,6		706,06	101,08	604,98	62,76	110,112	11,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	**ФЕР27-06-001-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: свыше 10,5 м2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): фер ОЗП=27,36; ЭМ=11,93; ЗПМ=27,36; МАТ=3,69*	100 м3	0,1	10305,49	1263,54	7562,23	784,5		1030,55	126,35	756,22	78,45	137,64	13,76	
12	**ФЕР24-02-032-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Укладка полиэтиленовых труб газопроводов в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода до 63 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): фер ОЗП=27,36; ЭМ=11,93; ЗПМ=27,36; МАТ=3,69*	100 м	4,22	179,43	39,23	140,2	9,05		757,19	165,55	591,64	38,19	3,9	16,46	
13	**ФЕР24-02-032-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Укладка полиэтиленовых труб газопроводов в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода свыше 63 до 110 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): фер ОЗП=27,36; ЭМ=11,93; ЗПМ=27,36; МАТ=3,69*	100 м	7,58	218,95	45,27	173,68	11,21		1659,64	343,15	1316,49	84,97	4,5	34,11	
14	**ФЕР24-02-032-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Укладка полиэтиленовых труб газопроводов в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода свыше 110 до 160 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): фер ОЗП=27,36; ЭМ=11,93; ЗПМ=27,36; МАТ=3,69*	100 м	4,36	218,95	45,27	173,68	11,21		954,62	197,38	757,24	48,88	4,5	19,62	
15	**ФЕР22-03-001-05** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): фер ОЗП=27,36; ЭМ=11,93; ЗПМ=27,36; МАТ=3,69*	т	0,5	24236,05	3923,64	13964,25	1418,06		12118,03	1961,82	6982,13	709,03	353,8	176,9	
17	**ФЕР47-01-046-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): фер ОЗП=27,36; ЭМ=11,93; ЗПМ=27,36; МАТ=3,69*	100 м2	3,3428	2296,1	317,6				7675,4	1061,67			40	133,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	**ФЕР47-01-046-06** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): фер ОЗП=27,36; ЭМ=11,93; ЗПМ=27,36; МАТ=3,69*	100 м2	3,3428	376,48	50,68	301,4	31,78		1258,5	169,41	1007,52	106,23	5,99	20,02	
19	**ФЕР22-06-011-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Подвешивание коробов подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,25 м2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): фер ОЗП=27,36; ЭМ=11,93; ЗПМ=27,36; МАТ=3,69*	м	10	133,81	12,28	27,29	3,44		1338,1	122,8	272,9	34,4	1,44	14,4	
20	**ФЕР27-02-010-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Демонтаж бортовых камней бетонных: при других видах покрытий *(Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): фер ОЗП=27,36; ЭМ=11,93; ЗПМ=27,36; МАТ=3,69*	100 м	1	577,94	514,92	63,02	7,71		577,94	514,92	63,02	7,71	60,864	60,86	
21	**ФЕР27-02-010-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): фер ОЗП=27,36; ЭМ=11,93; ЗПМ=27,36; МАТ=3,69*	100 м	1	4412,47	643,64	78,78	9,64		4412,47	643,64	78,78	9,64	76,08	76,08	
22	**ФЕРр68-12-18** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): фер ОЗП=27,36; ЭМ=11,93; ЗПМ=27,36; МАТ=3,69*	100 м2	1	5093,83	2309,05	2390,83	262,03		5093,83	2309,05	2390,83	262,03	285,42	285,42	
23	**ФЕР27-05-002-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство мостовых мозаиковых с заполнением швов цементным раствором при высоте мозаиковой шашки: 10 см *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): фер ОЗП=27,36; ЭМ=11,93; ЗПМ=27,36; МАТ=3,69*	1000 м2	0,1	20285,96	7558,54	2170,24	232,12		2028,6	755,85	217,02	23,21	804,1	80,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	**ФЕР46-03-007-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Пробивка проемов в конструкциях: из бетона *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): фер ОЗП=27,36; ЭМ=11,93; ЗПМ=27,36; МАТ=3,69*	м3	1	654,12	247,66	406,46			654,12	247,66	406,46		27,61	27,61	
25	**ФЕР46-03-017-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): фер ОЗП=27,36; ЭМ=11,93; ЗПМ=27,36; МАТ=3,69*	м3	1	1239,98	611,44	28,65	4,99		1239,98	611,44	28,65	4,99	75,58	75,58	
26	**ФЕР22-05-003-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 150 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): фер ОЗП=27,36; ЭМ=11,93; ЗПМ=27,36; МАТ=3,69*	100 м	0,5	2094,58	862,91	30,74	2,2		1047,29	431,46	15,37	1,1	89,7	44,85	
27	**ФЕР27-06-007-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство швов в бетоне: затвердевшем *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): фер ОЗП=27,36; ЭМ=11,93; ЗПМ=27,36; МАТ=3,69*	100 м	0,8	5804,92	66,9	5329,79	215,29		4643,94	53,52	4263,83	172,23	8,5	6,8	
28	**ФЕРр68-12-4** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): фер ОЗП=27,36; ЭМ=11,93; ЗПМ=27,36; МАТ=3,69*	100 м3	0,04	6008,44	2022,24	3986,2	423,75		240,34	80,89	159,45	16,95	243,35	9,73	
29	**ФЕРр68-10-2** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): фер ОЗП=27,36; ЭМ=11,93; ЗПМ=27,36; МАТ=3,69*	100 т	0,09	50517,35	824,63	3228,78	414,45		4546,56	74,22	290,59	37,3	85,72	7,71	
30	**04.2.01.02-0011**	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): фер ОЗП=27,36; ЭМ=11,93; ЗПМ=27,36; МАТ=3,69*	т	-9	459,91					-4139,19						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	**ФЕРр69-16-2** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): фер ОЗП=27,36; ЭМ=11,93; ЗПМ=27,36; МАТ=3,69*	100 м2	0,2	7755,72	1024,44	2380,61	233,65		1551,14	204,89	476,12	46,73	126,63	25,33	
Материалы по ГВС																
32	Группа ПОЛИМЕР ТЕПЛО	Пресс-фитинг с ПВ под сварку 160 (Т) КТЗ Белтрубпласт	шт.	4	18211,5					72846						
33	Группа ПОЛИМЕР ТЕПЛО	Пресс-фитинг с ПВ под сварку 140 (Т) КТЗ Белтрубпласт	шт.	10	16628,5					166285						
34	Группа ПОЛИМЕР ТЕПЛО	Пресс-фитинг с ПВ под сварку 110 (Т) КТЗ Белтрубпласт	шт.	8	12100,5					96804						
35	Группа ПОЛИМЕР ТЕПЛО	Пресс-фитинг с ПВ под сварку 90 (Т) КТЗ Белтрубпласт	шт.	8	10026					80208						
36	Группа ПОЛИМЕР ТЕПЛО	Пресс-фитинг с ПВ под сварку 75 (Т) КТЗ Белтрубпласт	шт.	12	8074,5					96894						
37	Группа ПОЛИМЕР ТЕПЛО	Пресс-фитинг с ПВ под сварку 63 (Т) КТЗ Белтрубпласт	шт.	12	6235,5					74826						
38	Группа ПОЛИМЕР ТЕПЛО	Пресс-фитинг с ПВМ под сварку 50 (Т) КТЗ Белтрубпласт	шт.	16	5599,3					89588,8						
39	Группа ПОЛИМЕР ТЕПЛО	Труба Изопрофлекс-А 160/225 Р 1,0 МПа	м.	66	7825					516450						
40	Группа ПОЛИМЕР ТЕПЛО	Труба Изопрофлекс-75А 140/180 Р 1,0 МПа	м.	218	6017					1311706						
41	Группа ПОЛИМЕР ТЕПЛО	Труба Изопрофлекс-75А 110/145 Р 1,0 МПа	м.	152	4148					630496						
42	Группа ПОЛИМЕР ТЕПЛО	Труба Изопрофлекс-75А 90/125 Р 1,0 МПа	м.	178	3557,5					633235						
43	Группа ПОЛИМЕР ТЕПЛО	Труба Изопрофлекс-75А 75/100 Р 1,0 МПа	м.	274	3070					841180						
44	Группа ПОЛИМЕР ТЕПЛО	Труба Изопрофлекс-75А 63/100 Р 1,0 МПа	м.	306	2342,5					716805						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
45	Группа ПОЛИМЕР ТЕПЛО	Труба Изопрофлекс-75А 50/90 Р 1,0 МПа	м.	422	1679					708538						
46	Группа ПОЛИМЕР ТЕПЛО	Предохранитель концевой DHEC2200 40/75	шт.	30 8+22	2437,5					73125						
47	Группа ПОЛИМЕР ТЕПЛО	Предохранитель концевой DHEC2600 110/145, 125/160, 140/180, 140/200	шт.	24	3561,5					85476						
48	Группа ПОЛИМЕР ТЕПЛО	Предохранитель концевой rec 110 40/75 50/90 50/100	шт.	26	2437,5					63375						
49	Группа ПОЛИМЕР ТЕПЛО	Предохранитель концевой rec 140 63/100 63/110	шт.	16	2437,5					39000						
50	Группа ПОЛИМЕР ТЕПЛО	Предохранитель концевой rec 225 90/160 110/145	шт.	10	3561,5					35615						
51	Группа ПОЛИМЕР ТЕПЛО	Предохранитель концевой rec 250 160/200 160/225	шт.	6	3561,5					21369						
52	Цена постовщика	Кран шаровый КШЦФ 050.040.02	шт.	3	1686,36					5059,08						
53	Цена постовщика	Кран шаровый КШЦФ ру 16 Ду 50/40	шт.	4	2880,51					11522,04						
54	Цена постовщика	Кран шаровый кшцф 080/70.016.02	шт.	2	2543,99					5087,98						
55	Цена постовщика	ФБС 24*6*4	шт.	2	3704,5					7409						
56	Цена постовщика	Плита перекрытия	шт.	2	15294,75					30589,5						
57	Цена постовщика	Щебень	тн	47	1525,42					71694,74						
58	Цена постовщика	Цемент	тн	3 2+1	4830,51					14491,53						
59	Цена постовщика	Песок	м3	500	197					98500						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
60	**Цена постовщика**	**Торф**	**м3**	**11**	**1200**					**13200**						
61	**Цена постовщика**	**Асфальтобетонная смесь**	**т.**	**7**	**4217,22**					**29520,54**						
62	**Цена постовщика**	**Асфальтобетонная смесь холодная**	**шт.**	**41**	**416,17**					**17062,97**						
										7339146,12	315219,22	296942,95	66521,74		1306,87	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										404355,05						
Накладные расходы										208511,87						
Сметная прибыль																
Итоги по смете:										1294053,86					1306,87	
Итого по позициям, введенным в базисных ценах										6657959,18						
Итого по позициям, введенным в текущих ценах										7952012,59					1306,87	
Итого																
В том числе:										6726983,95						
Материалы										296942,95						
Машины и механизмы										381740,96						
ФОТ										404355,05						
Накладные расходы										208511,42						
Сметная прибыль										7952012,59					1306,87	
ВСЕГО по смете																

Составил _____ зам.начальника ПТО АО "УТЭ" Сергеев С.В.

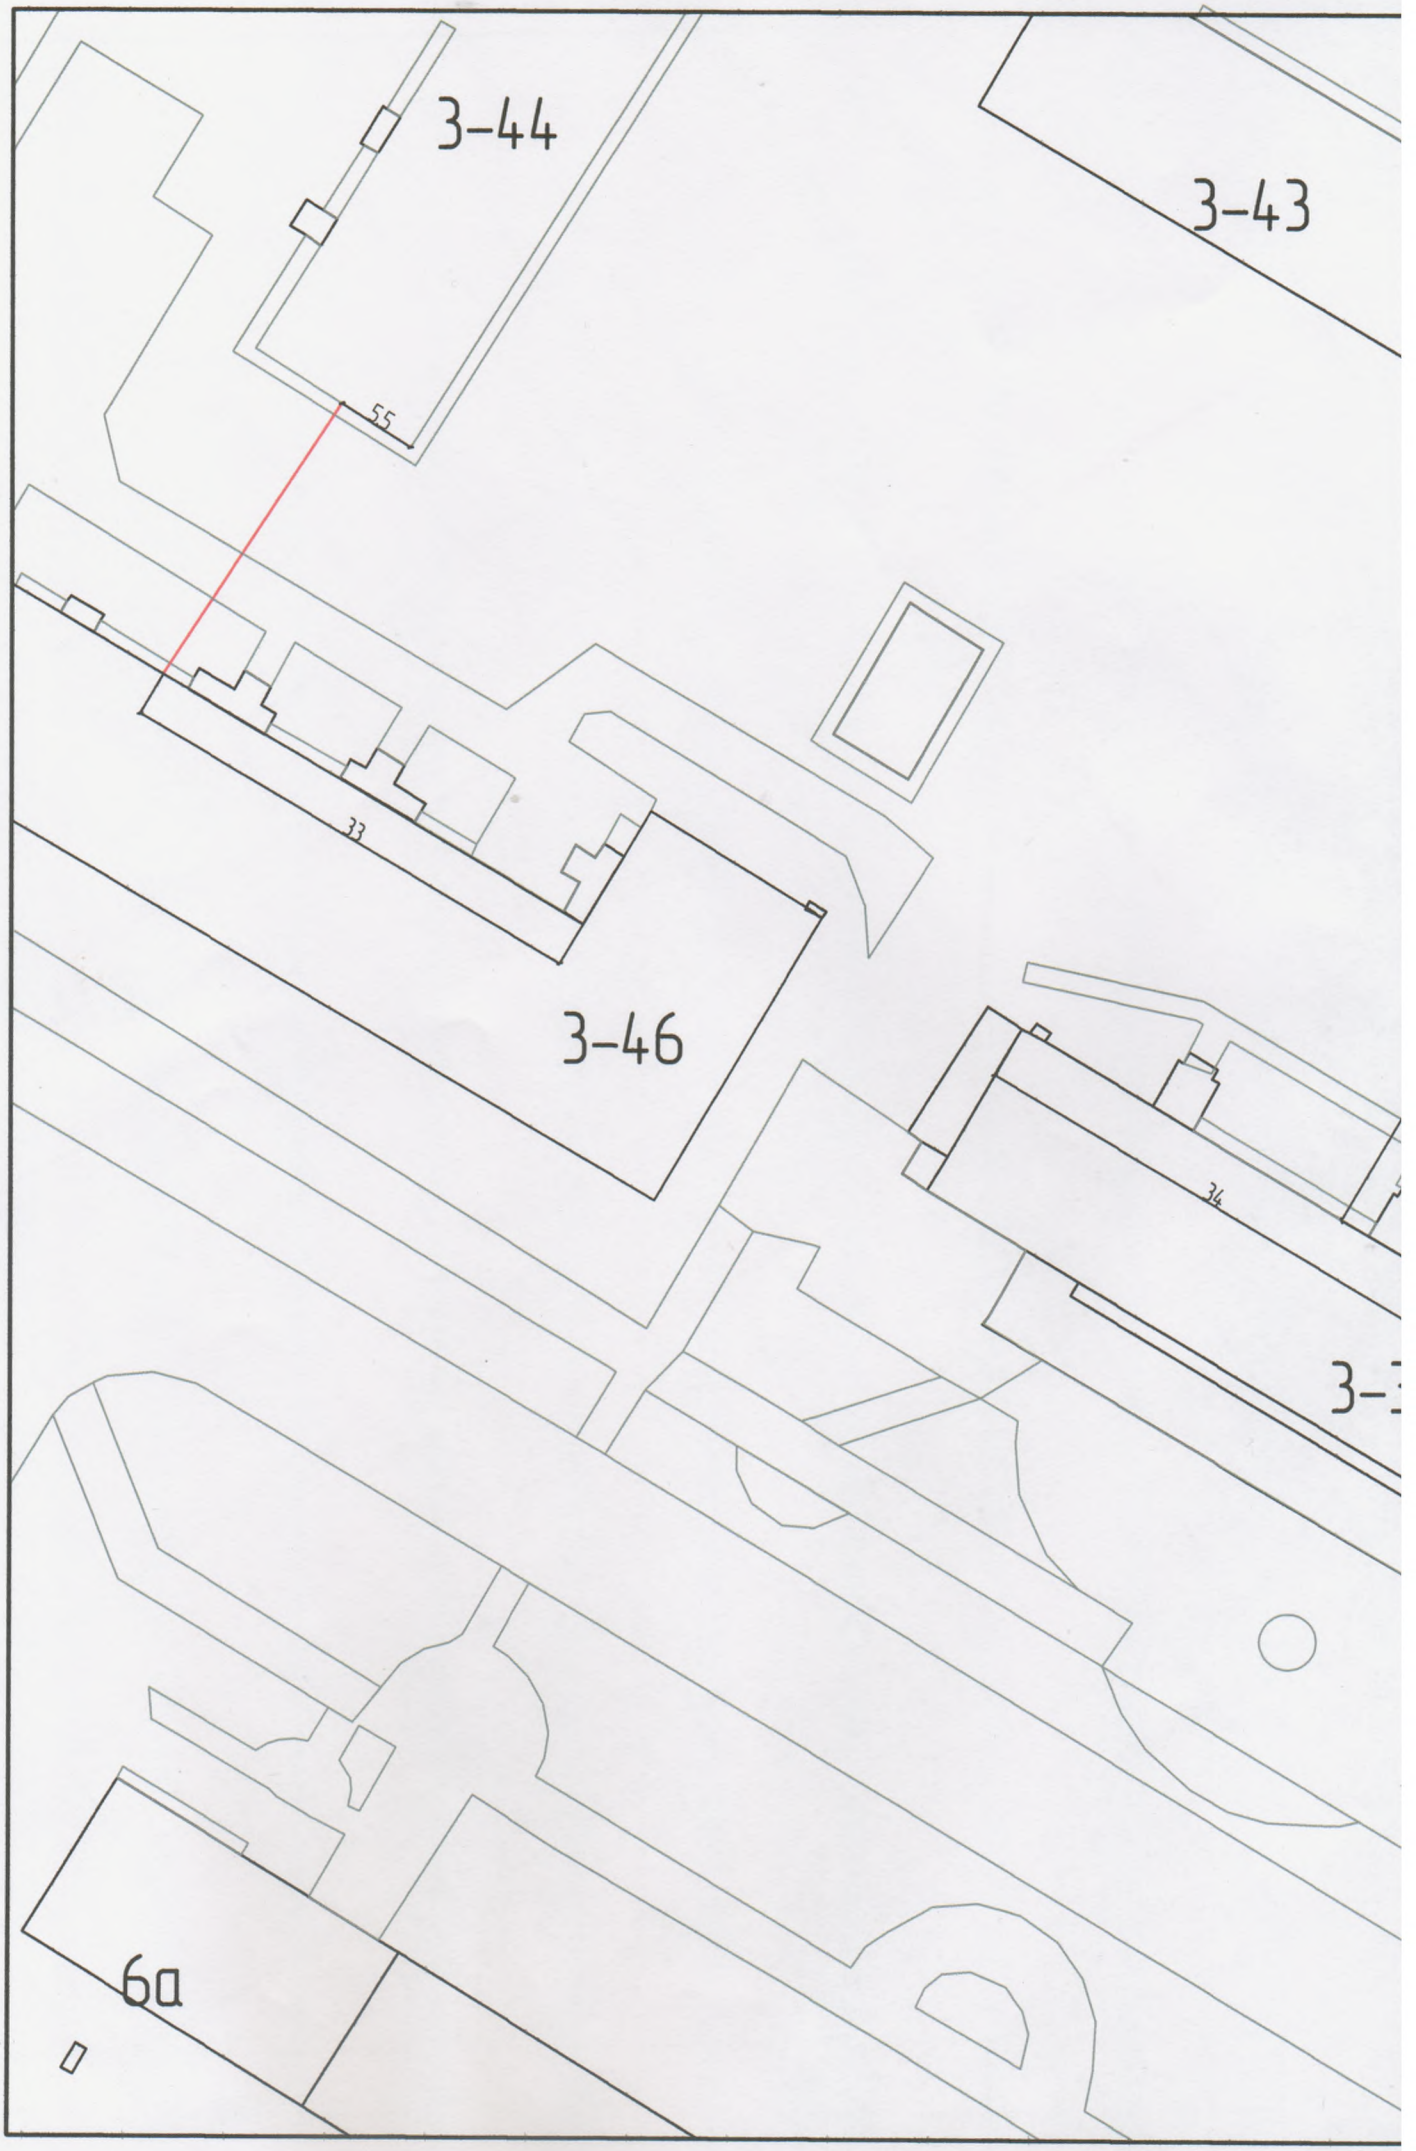
3-44
3-43
55
33
3-46
34
6a

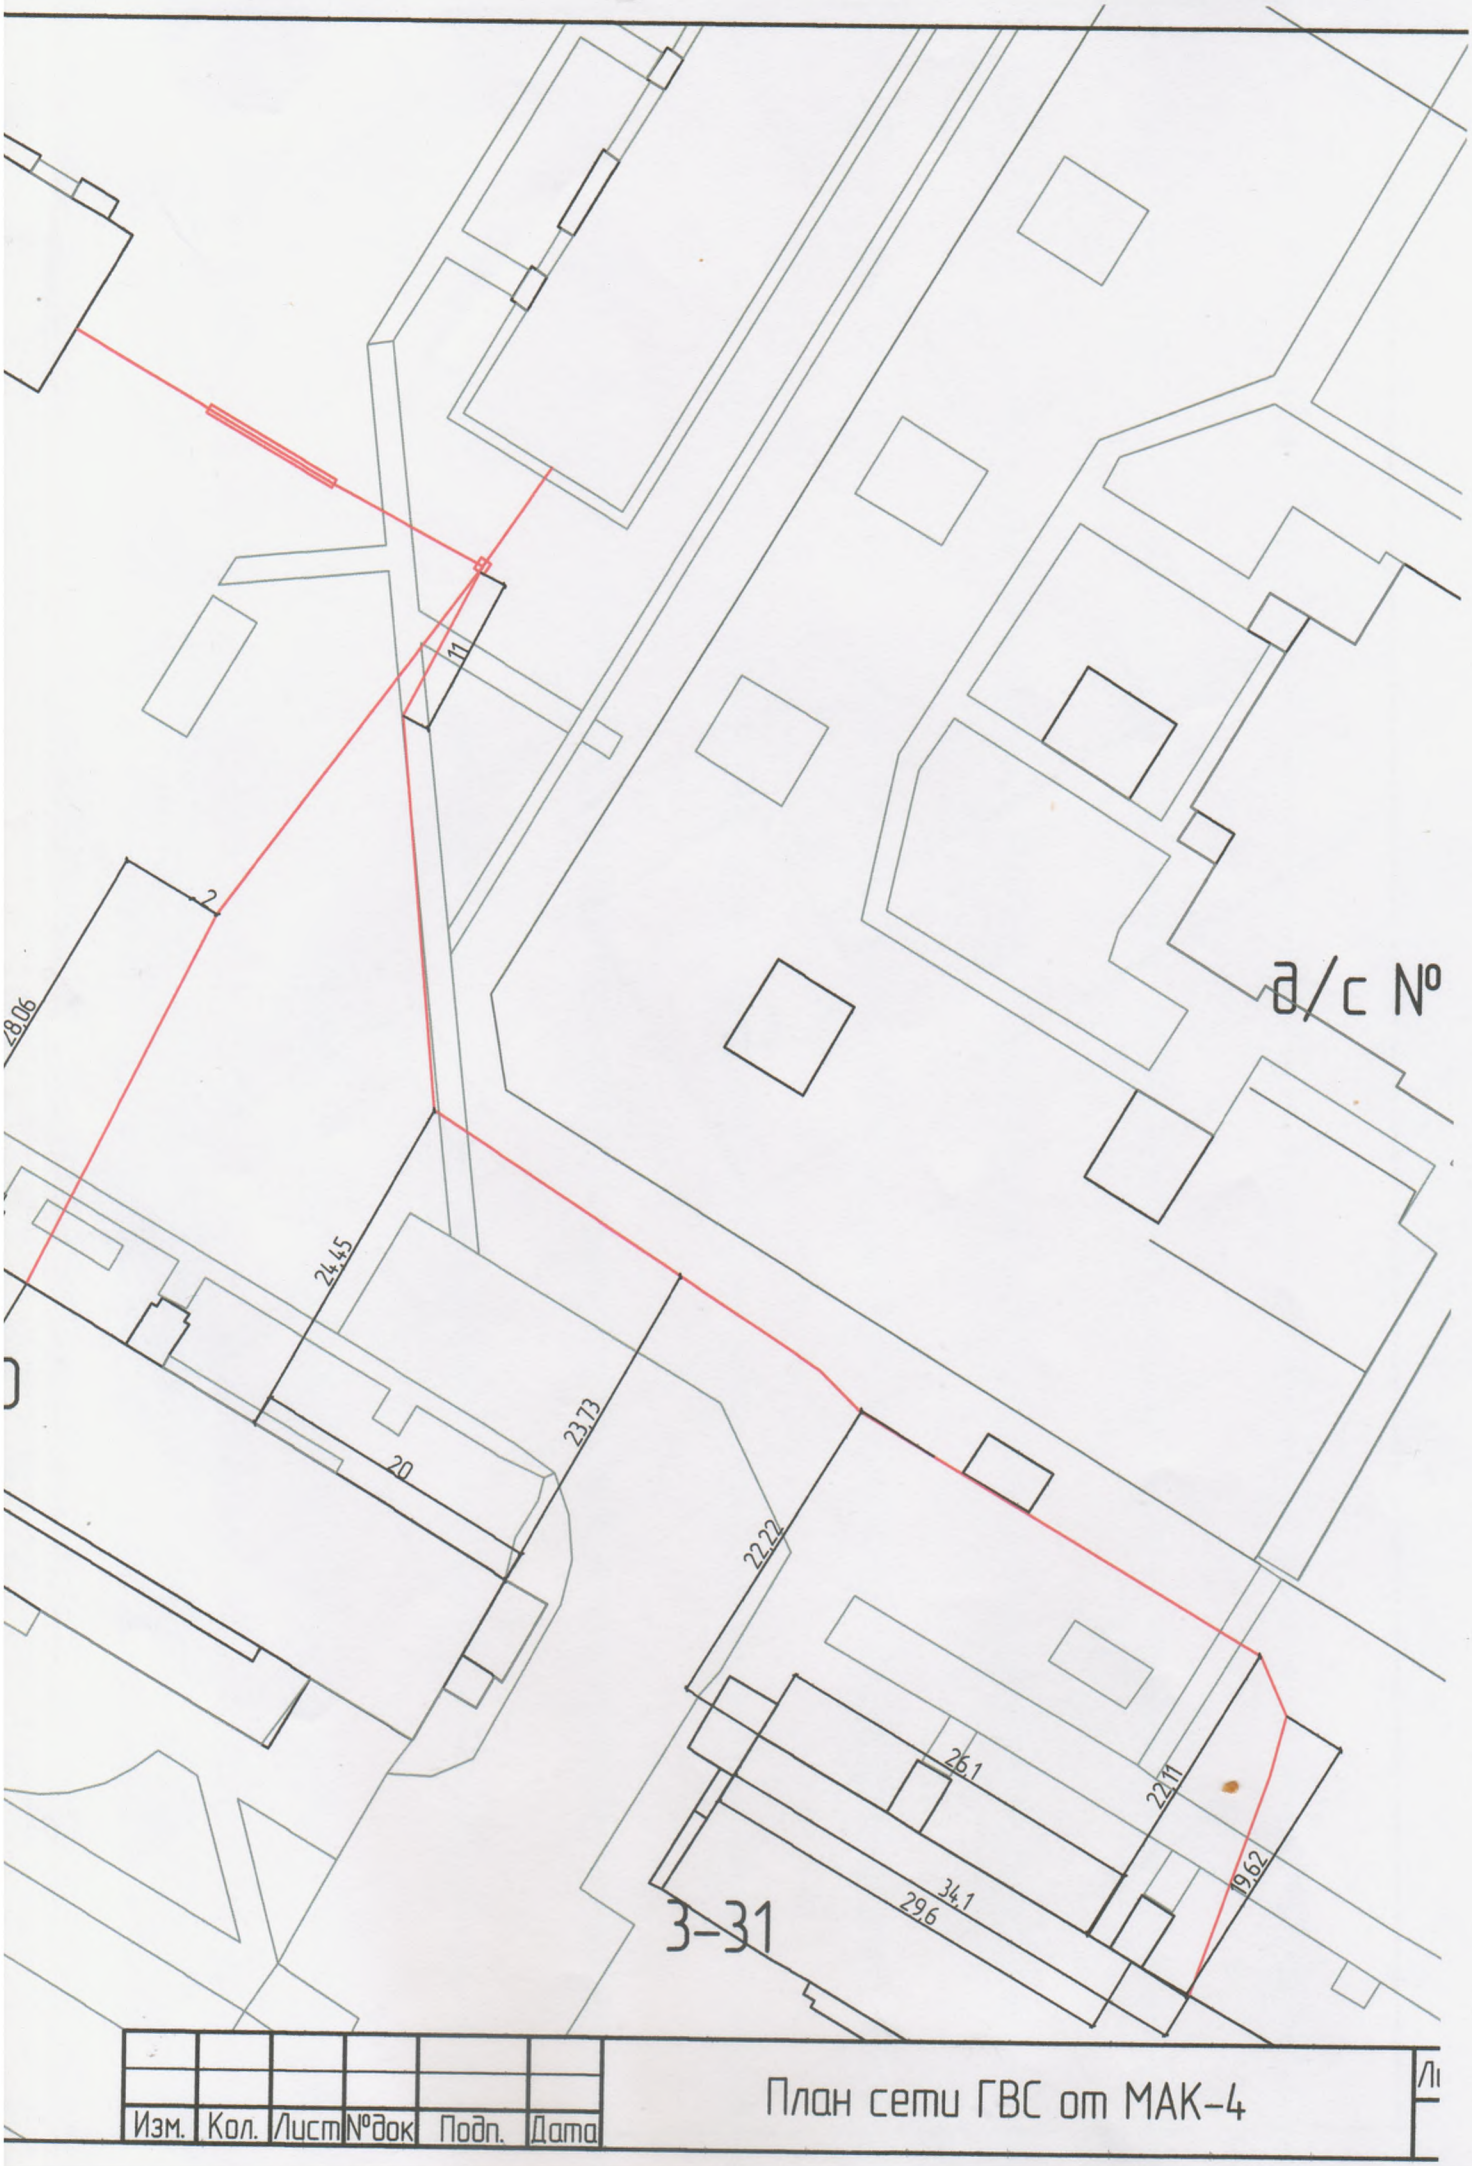

Изм.	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата

План сети ГВС от МАК-4

Л

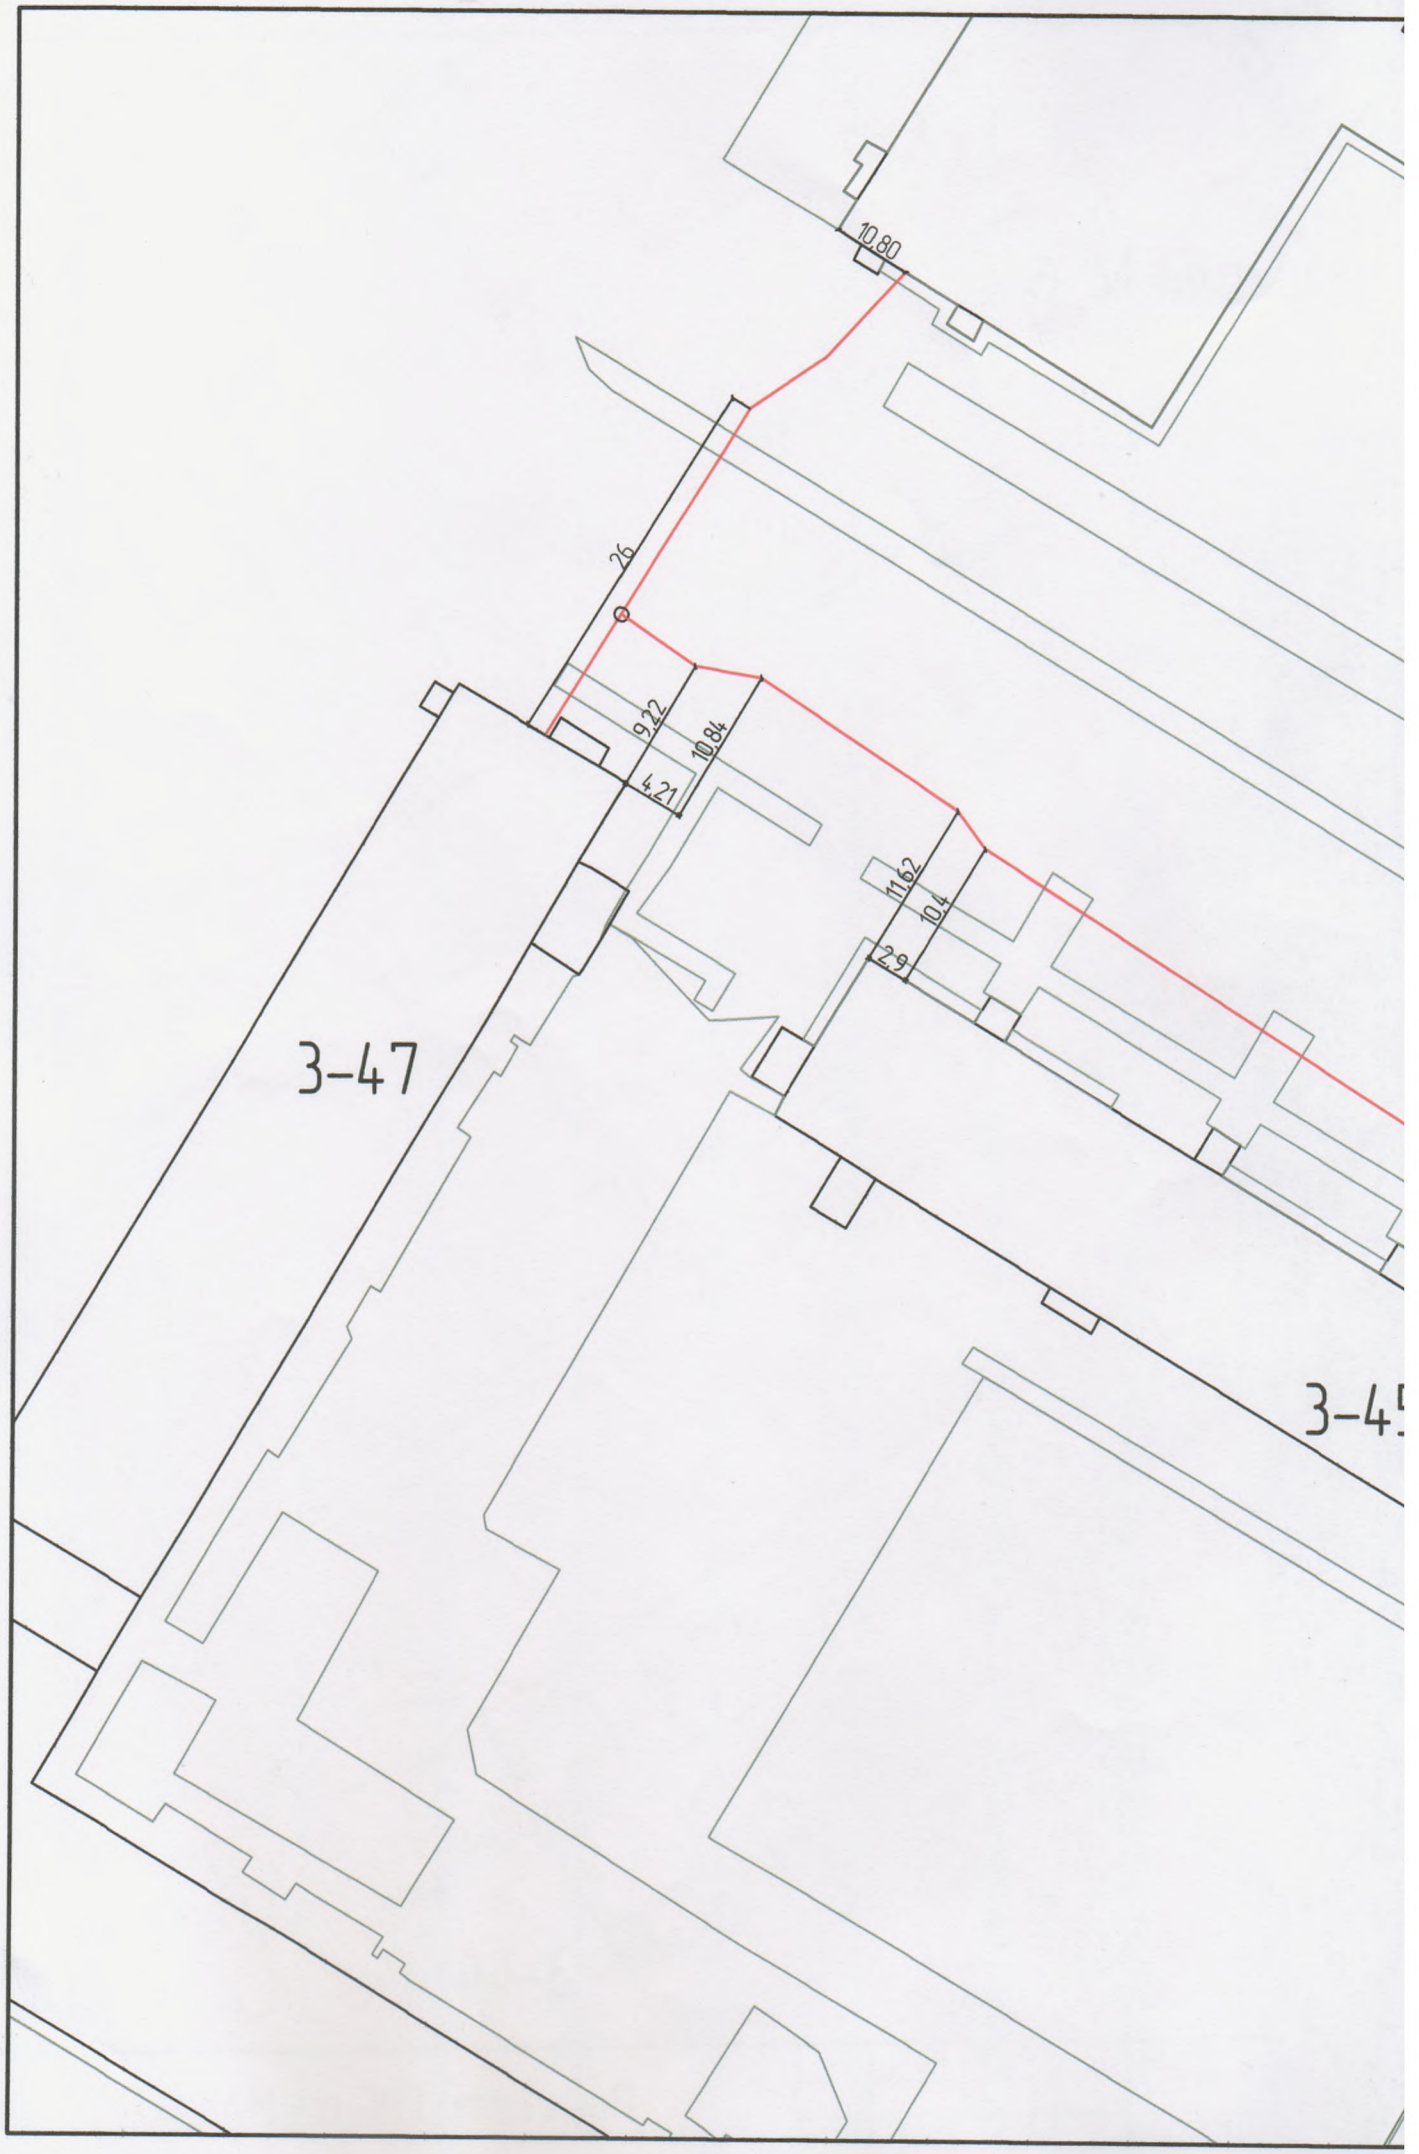
10.80
26
9.22
10.84
4.21
11.62
10.4
2.9
3-47
3-45

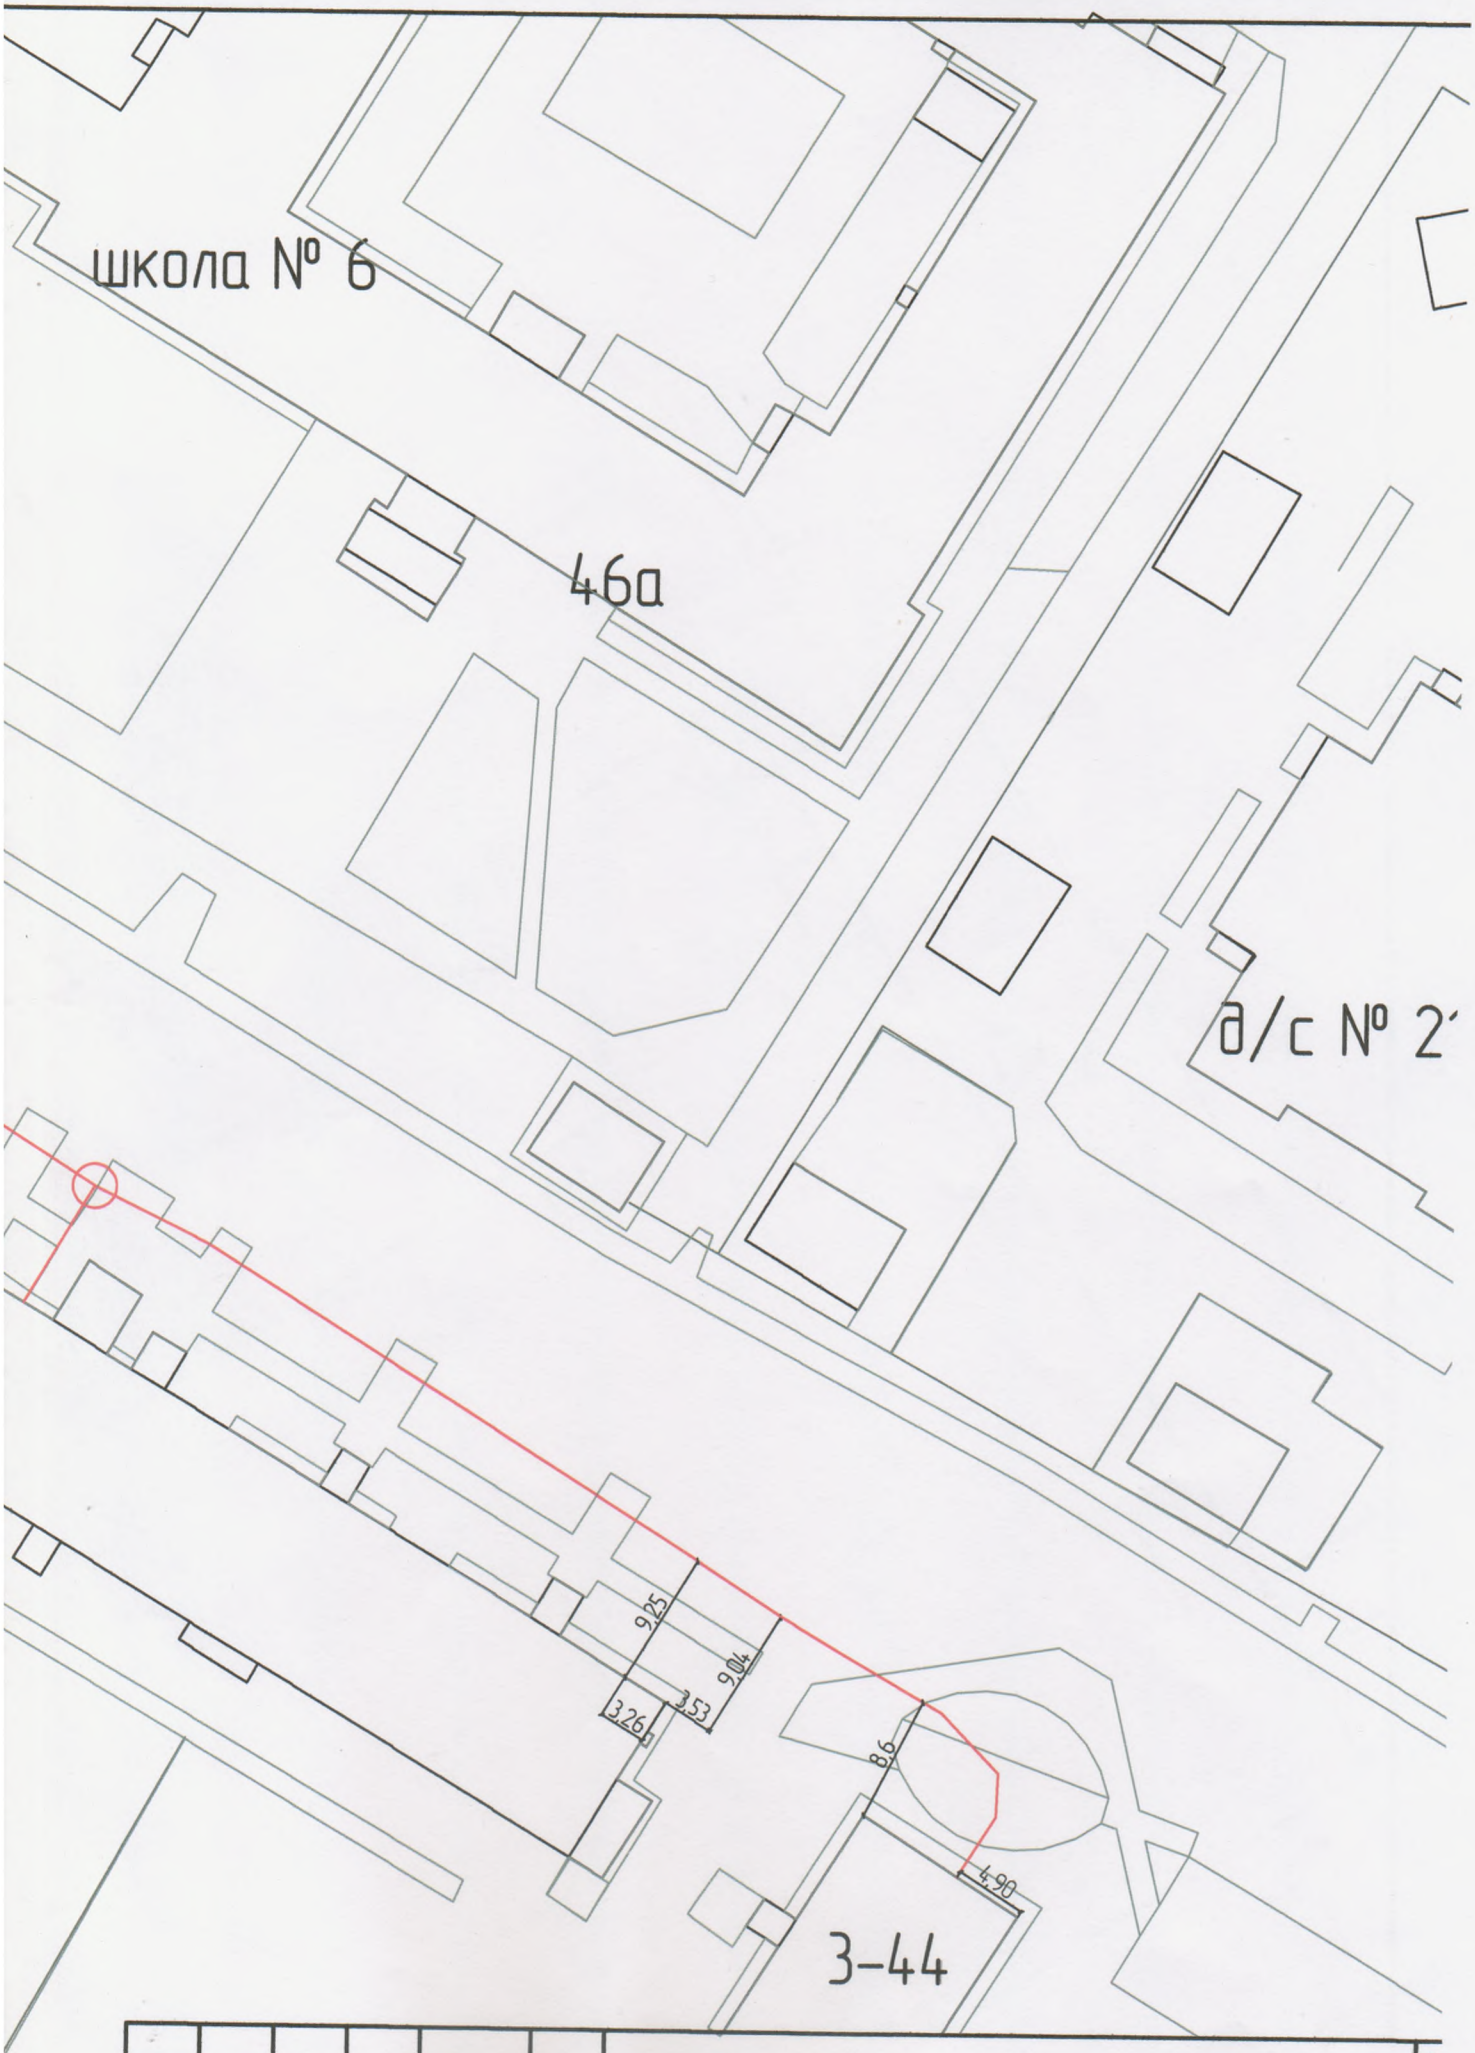

Изм.	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата

План сети ГВС от МАК-4

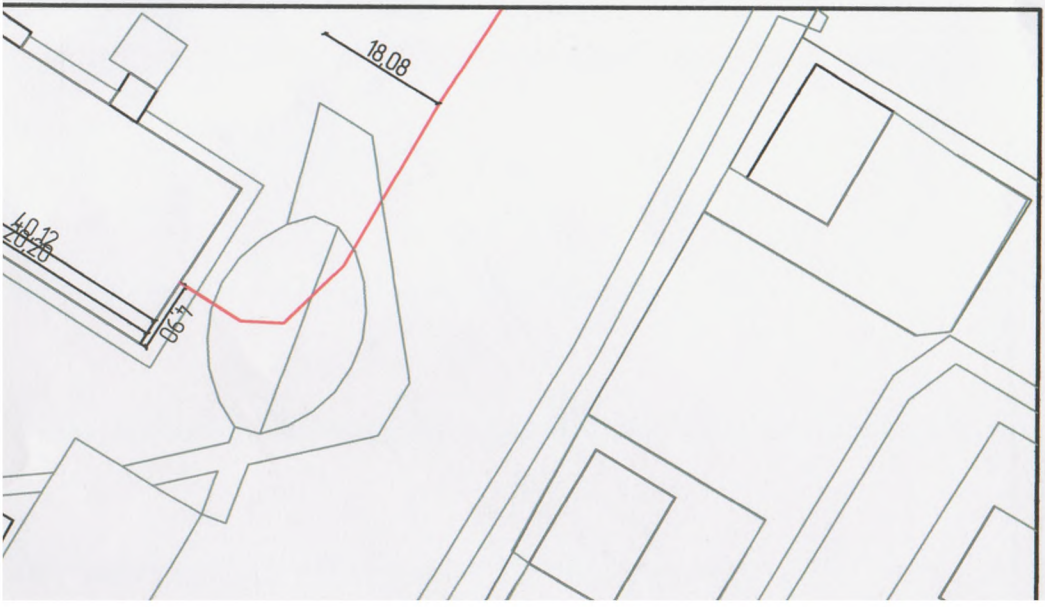
18.08
40.12
26.26
6.54

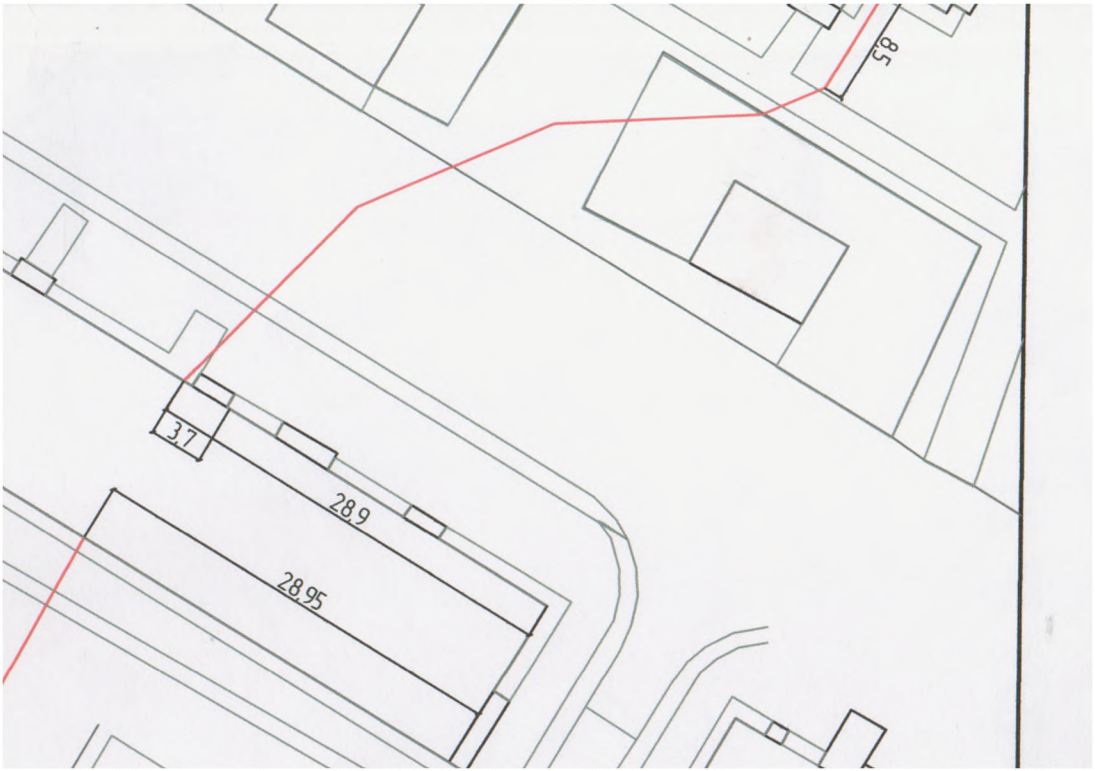
85
37
289
2895
